

Plan Global Unifié — Refonte Architecture AssoAI

Architecture Hermes-native · Sidebar unifiée · Gestion de projet pilotée par IA Date : 7 Juin 2026 —
Version 3.0 · Document de référence unique Auteur : Imprimelle (CEO) & Hermes Agent (Architecte) Statut : Prêt
pour exécution — Bloc 1

Table des matières

PARTIE A — ARCHITECTURE

- 1. [Décision architecturale : Unification sous l'API Hermes](#)
- 2. [L'API Router Hermes — Le cerveau de la sidebar](#)
- 3. [Migration Wari & Brico — De l'injection texte aux profils Hermes](#)

PARTIE B — ÉQUIPE IA

- 1. [Les 5 Profils Hermes — Équipe complète](#)
- 2. [Skills & Outils par profil](#)

PARTIE C — INTERFACE

- 1. [La Sidebar Unifiée — Moteur modernisé, interface inchangée](#)
- 2. [La Nouvelle Page Projet — Interface dédiée](#)
- 3. [La Page Configuration — Agents + Logs unifiés](#)

PARTIE D — PROCÉDURAL

- 1. [Flux de dérivation intelligent — CDC → Kanban](#)
- 2. [Matrice de routage — Quel agent sur quelle page](#)

PARTIE E — DÉPLOIEMENT

- 1. [Plan Walking Skeleton — 4 Blocs](#)
 - 2. [Détail par bloc — Tâches, fichiers, validation](#)
 - 3. [Stratégie de transition — Ancien → Nouveau](#)
 - 4. [Récapitulatif des livrables](#)
-


PARTIE A — ARCHITECTURE

1. Décision architecturale : Unification sous l'API Hermes

1.1 Le problème actuel



1.2 La solution : Tout passe par l'API Hermes

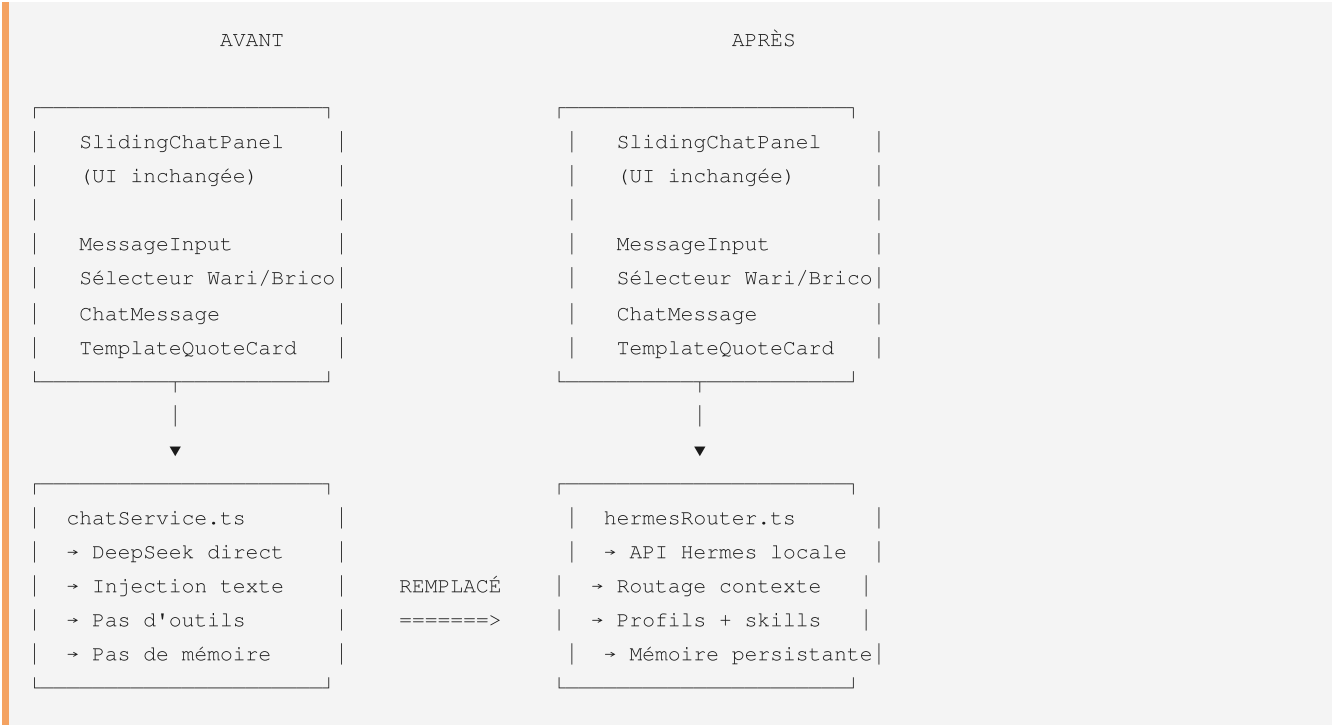

2. L'API Router Hermes — Le cerveau de la sidebar

2.1 Fonctionnement

Le routeur est un **endpoint HTTP local** qui reçoit le message utilisateur + le contexte de la page, et le route vers le bon profil Hermes.

```
// Nouveau fichier : src/services/hermesRouter.ts

interface HermesRouteRequest {
  message: string;           // Le message de l'utilisateur
  userId: string;
  sessionId: string;         // Session persistante
  pageContext: PageContext;  // Détecté automatiquement
  attachedTemplate?: {       // Si un document est cité/référencé
    templateType: TemplateType;
    data: TemplateData;
  };
  attachedQuote?: QuoteData; // Si un document est cité en contexte
}

interface PageContext {
  route: string;             // ex: '/chat', '/projects/abc-123', '/products'
  pageType: 'general' | 'facture' | 'commande' | 'cdc' | 'products' | 'project' | 'agent-config';
  projectId?: string;        // Si sur une page projet
  documentType?: TemplateType; // Si sur une page document
}

// Routage :
// pageType = 'general' | 'facture' | 'commande' | undefined → Hermes-Wari
// pageType = 'cdc' | 'products' → Hermes-Brico
// pageType = 'project' → Hermes-PM
// pageType = 'agent-config' → Hermes-Wari (configuration)
```

2.2 Détection automatique du contexte

```
// src/services/pageContextDetector.ts

export function detectPageContext(): PageContext {
  const path = window.location.pathname;

  // Projet dédié
  const projectMatch = path.match(/^\/projects\/(.+)\$/);
  if (projectMatch) {
    return {
      route: path,
      pageType: 'project',
      projectId: projectMatch[1]
    };
  }

  // Page Catalogue Produits
  if (path.startsWith('/products')) {
    return { route: path, pageType: 'products' };
  }

  // Page Configuration Agents
  if (path.startsWith('/agent-config')) {
    return { route: path, pageType: 'agent-config' };
  }

  // CRM Templates (lecture seule)
  if (path.startsWith('/templates')) {
    return { route: path, pageType: 'general' };
  }

  // Page Chat ou Dashboard – détection intelligente
  // Si un template de CDC est ouvert → Brico
  // Si un template de Facture/Commande est ouvert → Wari
  // Sinon → Wari (défaut)
  return { route: path, pageType: 'general' };
}
```

2.3 API Hermes locale

L'application frontend appelle un endpoint HTTP local exposé par le serveur Hermes :

```
POST http://localhost:11434/hermes/router
Content-Type: application/json
```

```
{
  "message": "Crée une facture pour Panneau LED 2m",
  "userId": "abc-123",
  "sessionId": "session_xyz",
  "pageContext": { "route": "/chat", "pageType": "general" },
  "attachedTemplate": null
}
```

→ RÉPONSE :

```
{
  "mode": "template",
  "templateType": "facture",
  "data": {
    "factureNumero": "F-2026-015",
    "client": { "nom": "Client", ... },
    "details": [...],
    "total": 240000
  },
  "metadata": {
    "agent": "Hermes-Wari",
    "skills_used": ["product-search", "document-create"],
    "tokens": 1240
  }
}
```

2.4 Le serveur Hermes local

Un petit serveur Express/Fastify dans le conteneur `hermes-webui` qui expose l'API :

```
// Nouveau : /workspace/chat-flow-templates-main/server/hermes-api.ts

import express from 'express';
import { spawn } from 'child_process';

const app = express();
app.use(express.json());

app.post('/hermes/router', async (req, res) => {
  const { message, userId, sessionId, pageContext } = req.body;

  // Déterminer le profil cible
  const profile = routeToProfile(pageContext);

  // Appeler Hermes avec le bon profil
  const result = await spawnHermes({
    profile,
    prompt: message,
    sessionId,
    userId,
    skills: getSkillsForProfile(profile),
    tools: getToolsForPage(pageContext)
  });

  res.json(result);
});

app.listen(11434, () => {
  console.log('Hermes API Router → http://localhost:11434');
});
```

3. Migration Wari & Brico — De l'injection texte aux profils Hermes

3.1 Ce qui est migré

Élément	Emplacement actuel	Destination
Prompt Wari	agentConfigStore.ts → localStorage	~/.hermes/profiles/hermes-wari/personality
Prompt Brico	agentConfigStore.ts → localStorage	~/.hermes/profiles/hermes-brico/personality
Catalogue produits	dataInjector.ts → injection texte	Skill product-search → Supabase direct
Règles fabrication	dataInjector.ts → injection texte	Skill manufacturing-rules → Supabase direct
Numéros documents	resolveDocumentContext() → RPC	Skill document-numbers → RPC Supabase
Dérivation	Règles dans le prompt	Skill document-derivation
Sélecteur agent	MessageInput.tsx	Inchangé visuellement, mais route vers le profil Hermes

3.2 Comparaison : avant vs après

AVANT (injection texte) :

```
| 1. ChatContainer.handleSendMessage() |
| 2. orchestrateRequest(payload, "wari") |
| 3. sendChatRequest() |
|   ├── getPrompt("wari") ← localStorage |
|   ├── prompt.replace("{INJECTED_PRODUCTS}", |
|   |   dataInjector.formatForWari(...)) |
|   ├── prompt.replace("{DOCUMENT_NUMBER}", |
|   |   resolveDocumentContext(...)) |
|   └── fetch("https://api.deepseek.com/...") |
| 4. parseAIResponse() → JSON → UI |
| |
| Tokens gaspillés : 2000+ tokens de |
| catalogue injectés à CHAQUE message |
```

APRÈS (API Hermes) :

```
| 1. ChatContainer.handleSendMessage() |
| 2. hermesRouter.send({ |
|   message, pageContext, template |
| }) |
| 3. API Hermes route → Hermes-Wari |
|   ├── Prompt système (préchargé, pas |
|   |   injecté à chaque appel) |
|   ├── Skill product-search → Supabase |
|   |   (appelé SEULEMENT si nécessaire) |
|   ├── Skill document-numbers → RPC |
|   └── DeepSeek via Hermes (tools natifs) |
| 4. Réponse JSON → UI |
| |
| Tokens économisés : ~2000 tokens/message |
| Outils réels : l'IA agit, ne se contente |
| pas de suggérer |
```

3.3 Plan de migration des prompts

Les prompts actuels (`agentConfigStore.ts`, 382 lignes) sont **préservés** — ils sont simplement déplacés dans les profils Hermes. L'utilisateur pourra toujours les modifier via la page Configuration.

```

# Création du profil Wari
hermes profile create hermes-wari --clone-from default

# Injection du prompt Wari actuel
# (lu depuis agentConfigStore.ts → DEFAULT_PROMPTS.wari)
hermes config set personality "$(cat /tmp/wari-prompt.txt)" --profile hermes-wari


# Création du profil Brico
hermes profile create hermes-brico --clone-from default

# Injection du prompt Brico actuel
hermes config set personality "$(cat /tmp/brico-prompt.txt)" --profile hermes-brico

```

PARTIE B — ÉQUIPE IA

4. Les 5 Profils Hermes — Équipe complète

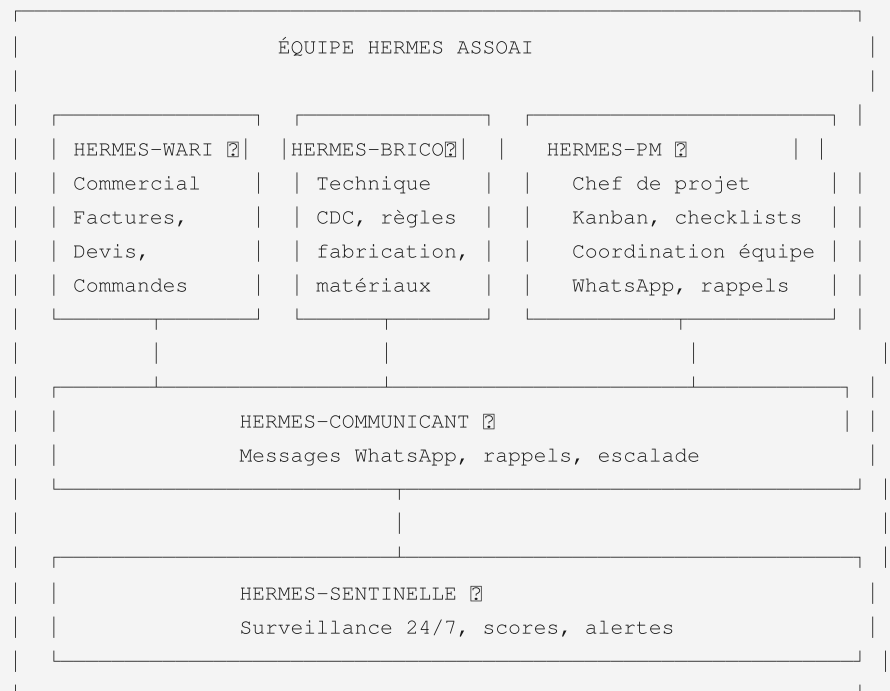

Profil	Icône	Rôle	Interagit avec	Pages actives
Hermes-Wari		Commercial : Factures, Devis, Commandes, questions générales	Utilisateur (sidebar)	/chat, /facture, /devis, /commande, /templates
Hermes-Brico		Technique : CDC, règles fabrication, matériaux	Utilisateur (sidebar)	/products, /cdc
Hermes-PM		Chef de projet : Kanban, checklists, coordination	Utilisateur (chat projet)	/projects/:id
Hermes-Communicant		Messenger : WhatsApp, rappels, notifications	Équipe terrain (WhatsApp)	Background (Kanban + Cron)
Hermes-Sentinelle		Veilleur : Surveillance 24/7, scores, alertes	Personne (autonome)	Background (Cron horaire)

5. Skills & Outils par profil

5.1 Hermes-Wari

```
# ~/.hermes/profiles/hermes-wari/config.yaml
skills:
  auto_load:
    - product-search      # Chercher produits/prix dans Supabase
    - document-create     # Créer facture, devis, commande
    - document-derivation  # Dériver facture→commande
    - document-update     # Modifier document existant
    - client-suggestions  # Suggérer clients depuis l'historique
    - document-numbers    # Allouer numéros via RPC Supabase

tools:
  enabled:
    - terminal            # Requêtes Supabase
    - web                 # Recherche informations
    - memory              # Préférences utilisateur
    - file                # Lecture config
    - todo                # Planification
```

5.2 Hermes-Brico

```
# ~/.hermes/profiles/hermes-brico/config.yaml
skills:
  auto_load:
    - manufacturing-rules    # Règles de fabrication par type d'enseigne
    - cdc-generate           # Générer cahier des charges
    - material-calculator   # Calculer matériaux, coûts
    - cdc-parse              # Parser CDC → extraire sections, matériaux
    - product-search         # Chercher produits (règles techniques)
    - enseigne-dimensions    # Valider dimensions, contraintes

tools:
  enabled:
    - terminal               # Requêtes Supabase
    - web                    # Recherche techniques
    - memory                 # Règles apprises
    - file                   # Lecture config
```

5.3 Hermes-PM ?

```
# ~/.hermes/profiles/hermes-pm/config.yaml
skills:
  auto_load:
    - project-orchestrator   # Orchestrer tâches, phases
    - kanban-manager         # CRUD tâches Kanban
    - checklist-validator    # Valider items automatiquement
    - project-reporting      # Rapports quotidiens
    - team-coordinator       # Coordonner équipe terrain

tools:
  enabled:
    - terminal               # Requêtes Supabase
    - web                    # Recherche
    - memory                 # Contexte projet
    - cronjob                # Rappels programmés
    - delegation             # Sous-traiter à Wari/Brico
```

5.4 Hermes-Communicant ?

```
# ~/.hermes/profiles/hermes-communicant/config.yaml
skills:
  auto_load:
    - whatsapp-notifier      # Templates WhatsApp
    - cron-reminders         # Programmation rappels
    - message-router         # Interpréter réponses WhatsApp
    - escalation-manager     # Escalade progressive

tools:
  enabled:
    - messaging              # send_message WhatsApp
    - cronjob                # Rappels
    - memory                 # Historique communications
    - web                    # Vérification statut
```

5.5 Hermes-Sentinelle ?

```
# ~/.hermes/profiles/hermes-sentinelle/config.yaml
skills:
  auto_load:
    - project-watcher      # Scanner projets actifs
    - anomaly-detector     # Détecter patterns anormaux
    - health-scorer        # Calculer Project Health Score

tools:
  enabled:
    - terminal             # Requêtes Supabase
    - web                  # Vérification
    - memory               # Seuils, historique
```

PARTIE C — INTERFACE

6. La Sidebar Unifiée — Moteur modernisé, interface inchangée

6.1 Principe

La sidebar **ne change pas d'aspect visuel** pour l'utilisateur. Le `SlidingChatPanel`, le `MessageInput`, le `ChatMessage`, les `TemplateQuoteCard` — tout reste identique.

Ce qui change : le code qui traite l'envoi du message.

```
AVANT (ChatContainer.tsx handleSendMessage) :
  orchestrateRequest(payload, activeAgent)
    → sendChatRequest(payload, agent)
    → fetch("https://api.deepseek.com/...")

APRÈS :
  hermesRouter.send({
    message: payload.message.content,
    userId: user.id,
    sessionId: sessionId.current,
    pageContext: detectPageContext(),
    attachedTemplate: payload.message.template,
    attachedQuote: payload.message.quote
  })
  → POST http://localhost:11434/hermes/router
  → spawn Hermes avec le bon profil
```

6.2 Fichiers modifiés

Fichier	Modification
src/services/orchestrator.ts	Réécrit — remplace <code>sendChatRequest</code> par appel API Hermes
src/services/hermesRouter.ts	Nouveau — client HTTP pour l'API Hermes
src/services/pageContextDetector.ts	Nouveau — détection de la page courante
src/components/chat/ChatContainer.tsx	Modifié — <code>handleSendMessage</code> utilise <code>hermesRouter</code>
src/components/chat/MessageInput.tsx	Inchangé — le sélecteur Wari/Brico persiste
src/components/chat/SlidingChatPanel.tsx	Inchangé — UI préservée

6.3 Le sélecteur d'agent — conservé, rôle clarifié

Le sélecteur Wari/Brico dans `MessageInput` est **conservé** visuellement. Son nouveau rôle :

- L'utilisateur peut **forcer** un agent (ex: poser une question technique à Brico depuis la page Facture)
- Si aucun agent n'est forcé → le routeur choisit automatiquement selon la page
- L'agent forcé est passé dans `pageContext.forcedAgent`

```
// MessageInput.tsx — inchangé visuellement
<AgentSelector
  activeAgent={activeAgent}
  onAgentChange={setActiveAgent}
/>

// hermesRouter.ts — nouvelle logique
function routeToProfile(pageContext, forcedAgent?) {
  if (forcedAgent === 'brico') return 'hermes-brico';
  if (forcedAgent === 'wari') return 'hermes-wari';

  // Routage automatique selon la page
  switch (pageContext.pageType) {
    case 'products':
    case 'cdc':
      return 'hermes-brico';
    case 'project':
      return 'hermes-pm';
    default:
      return 'hermes-wari';
  }
}
```

7. La Nouvelle Page Projet — Interface dédiée

7.1 Remplacement de l'ancien système

Directive : L'ancien module projet (ProjectDetails.tsx, ProjectList.tsx, ProjectCard.tsx) est **obsolète et entièrement remplacé** par la nouvelle interface.

7.2 Layout de la nouvelle page

← Projets	[🔍 Rechercher un projet...]	[+ Nouveau]
-----------	-----------------------------	-------------

🔍 PROJET : Enseigne Hôtel Ivoire [▶]

Phase : Fabrication · Livraison 12 Juin · Score 72

🔍 Facture F-2026-005 [Voir] [PDF]

Client : Hôtel Ivoire · 2 450 000 FCFA

(dérivation)

🔍 Commande CMD-2026-004 [Voir] [PDF]

3 articles · 2 200 000 FCFA

(dérivation)

🔍 CDC CDC-2026-001 [Voir] [PDF]

2 enseignes · 18 matériaux

🔍 Devis D-2026-002 [Voir] [PDF]

3 000 000 FCFA

🔍 PROJET : Totem Banque Atlantique [▶]

Phase : Commande · Score 88

🔍 Facture

🔍 Commande

[+ Créer un nouveau projet]

Fonctionnalité	Description
Recherche avec suggestions	Widget de recherche par nom de projet, client, numéro de facture
Cartes en accordéon	Chaque projet est une carte cliquable qui se déplie pour montrer ses documents
Sections documents en accordéon	Facture(1), Commande(1), CDC(1), Devis(≥ 1) — chaque section listant les documents
Bouton flottant +	Créer un nouveau projet (recherche facture existante OU nouvelle facture)
Badge de phase	Code couleur :  Facturation,  Commande,  Fabrication,  Livré
Score de santé	Affiché sur chaque carte (couleur selon score)
Clic sur 	Ouvre la page détail du projet

7.4 Création d'un projet

NOUVEAU PROJET

 Rechercher une facture existante...

F-2026-005 — Hôtel Ivoire — 2 450 000 FCFA

F-2026-008 — Banque Atlantique — 1 800 000

...

— OU —

✱ Créer une nouvelle facture

(ouvre Wari dans la sidebar)

— Puis —

Nom du projet : [_____]

Date livraison : [12/06/2026]

Équipe : [+ Ajouter un contact]

[Créer le projet]

7.5 Page détail — `/projects/:id`

← Projets

Projet: Hôtel Ivoire

Phase: Fabrication

[Documents]

[Kanban]

[Checklists]

[Chat Projet]

ONGLET KANBAN :

À FAIRE	EN COURS	EN RÉVISION	TERMINÉ
Commander	Découpe	Contrôle	Réception
acrylique	panneaux	dimensions	matériel
🕒 High	🕒 Medium	🕒 Medium	🕒 Done
🕒 Logist.	🕒 Tech.	🕒 Superv.	5 Juin

[+ Ajouter une tâche]

8. La Page Configuration — Agents + Logs unifiés

8.1 Évolution de /agent-config

La page actuelle /agent-config devient une **page de configuration unifiée** avec 3 onglets :

⚙ Configuration
[Agents] [Logs] [Projets]

ONGLET AGENTS :

🔍 Wari (Commercial)	[Éditer]
🔍 Brico (Technique)	[Éditer]
🔍 Chef de Projet	[Éditer]
🔍 Communicant	[Éditer]
🔍 Sentinelle	[Éditer]

ONGLET LOGS :

[chat] [tool] [error] [warn] [info] 🔍 Filtrer
12:45:32 [chat] Wari → Réponse facture F-2026-015
12:44:18 [tool] Brico → skill:manufacturing-rules
12:43:01 [chat] PM → Rapport quotidien généré
11:00:00 [cron] Sentinelle → Scan OK (score 85)

ONGLET PROJETS (futur) :

Templates de projet, workflows, phases par défaut

PARTIE D — PROCÉDURAL

9. Flux de dérivation intelligent — CDC → Kanban

9.1 La séquence complète

C'est le **flux clé** qui différencie le nouveau système de l'ancien. Quand un CDC est créé (par Brico), le système parse automatiquement son contenu pour créer les tâches Kanban et les checklists.

ÉTAPE 1 : L'UTILISATEUR CRÉE LE CDC

User → Sidebar → Hermes-PM → Hermes-Brico (délégation)

Brico génère le CDC avec :

- enseignes[].matériauxSections.{Découpe, Éclairage, Structure...}
- equipe[] (techniciens assignés)

ÉTAPE 2 : HERMES-PM PARSE LE CDC (skill: cdc-parse)

Pour chaque enseigne :

1. Extrait les sections de matériaux
2. Pour chaque section, crée une checklist :
 - Découpe → Checklist "Découpe – Enseigne X"
 - Éclairage → Checklist "Éclairage – Enseigne X"
3. Pour chaque matériau dans la section, crée un item de checklist

ÉTAPE 3 : CRÉATION DES TÂCHES KANBAN (skill: kanban-manager)

Pour chaque section de matériaux :

1. Crée une tâche "Préparer {section} – {enseigne}"
2. Assigne au technicien (via equipe[])
3. Définit la deadline (calculée depuis projects.date_livraison)
4. Lie la tâche à la checklist correspondante

ÉTAPE 4 : CRÉATION DES TÂCHES D'APPROVISIONNEMENT

Pour chaque matériau unique (dédupliqué) :

1. Crée une tâche "Commander {matériau}"
2. Assigne au logisticien
3. Priorité selon dépendances

ÉTAPE 5 : NOTIFICATION (Hermes-Communicant)

WhatsApp → Logisticien : liste des matériaux à commander

WhatsApp → Technicien : planning des tâches

9.2 Exemple concret

CDC généré par Brico :

```
{
  enseignes: [
    {
      nom: "Enseigne façade 4m×1.5m",
      materiauxSections: {
        "Découpe": [
          { nom: "Acrylique 3mm", quantite: 12, unite: "panneau" },
          { nom: "Aluminium profilé", quantite: 8, unite: "barre" }
        ],
        "Éclairage": [
          { nom: "LED 12V blanche", quantite: 200, unite: "unité" },
          { nom: "Transformateur 200W", quantite: 2, unite: "unité" }
        ]
      }
    },
    {
      nom: "Totem parking",
      materiauxSections: {
        "Structure": [
          { nom: "Acier galvanisé", quantite: 3, unite: "poteau" },
          { nom: "Dibond 3mm", quantite: 4, unite: "panneau" }
        ]
      }
    }
  ],
  equipe: [
    { nom: "Kouamé", role: "Technicien" },
    { nom: "M. Koné", role: "Superviseur" }
  ]
}
```

↓ cdc-parse + kanban-manager ↓

CHECKLISTS CRÉÉES :

- ✓ Checklist Découpe – Enseigne façade (2 items)
- ✓ Checklist Éclairage – Enseigne façade (2 items)
- ✓ Checklist Structure – Totem parking (2 items)

TÂCHES KANBAN CRÉÉES :

- 📅 Préparer Découpe – Enseigne façade · 📅 Kouamé · 📅 10 Juin
- 📅 Préparer Éclairage – Enseigne façade · 📅 Kouamé · 📅 11 Juin
- 📅 Préparer Structure – Totem parking · 📅 Kouamé · 📅 10 Juin
- 📅 Commander Acrylique 3mm · 📅 Logisticien · 📅 7 Juin 📅
- 📅 Commander Aluminium profilé · 📅 Logisticien · 📅 7 Juin 📅
- 📅 Commander LED 12V · 📅 Logisticien · 📅 7 Juin 📅
- 📅 Commander Acier galvanisé · 📅 Logisticien · 📅 7 Juin 📅


10. Matrice de routage — Quel agent sur quelle page

URL / Contexte	Agent par défaut	Agent alternatif (si forcé)	Skills actifs
/chat (général)	Hermes-Wari	Brico	product-search, document-create
/templates (CRM)	Hermes-Wari	Brico	document-update, document-view
/products	Hermes-Brico	Wari	manufacturing-rules, product-search
/projects (liste)	Hermes-Wari	—	document-search
/projects/:id → Onglet Documents	Hermes-PM	Wari, Brico	project-orchestrator, document-view
/projects/:id → Onglet Kanban	Hermes-PM	—	kanban-manager
/projects/:id → Onglet Checklists	Hermes-PM	—	checklist-validator
/projects/:id → Onglet Chat	Hermes-PM	—	Tous skills PM
/agent-config	Hermes-Wari	—	agent-config
/logs	Hermes-Wari	—	log-viewer
Création document (sidebar contextuelle)	Selon type : Facture→Wari, CDC→Brico	—	document-create, cdc-generate
Modification document (template ouvert)	Selon type du document	—	document-update
Dérivation (template A → type B)	Agent du type B	—	document-derivation

PARTIE E — DÉPLOIEMENT

11. Plan Walking Skeleton — 4 Blocs

Principe Walking Skeleton : Chaque bloc produit un système **fonctionnel et utilisable**. On ne construit pas tout puis on allume — on allume à chaque étape.

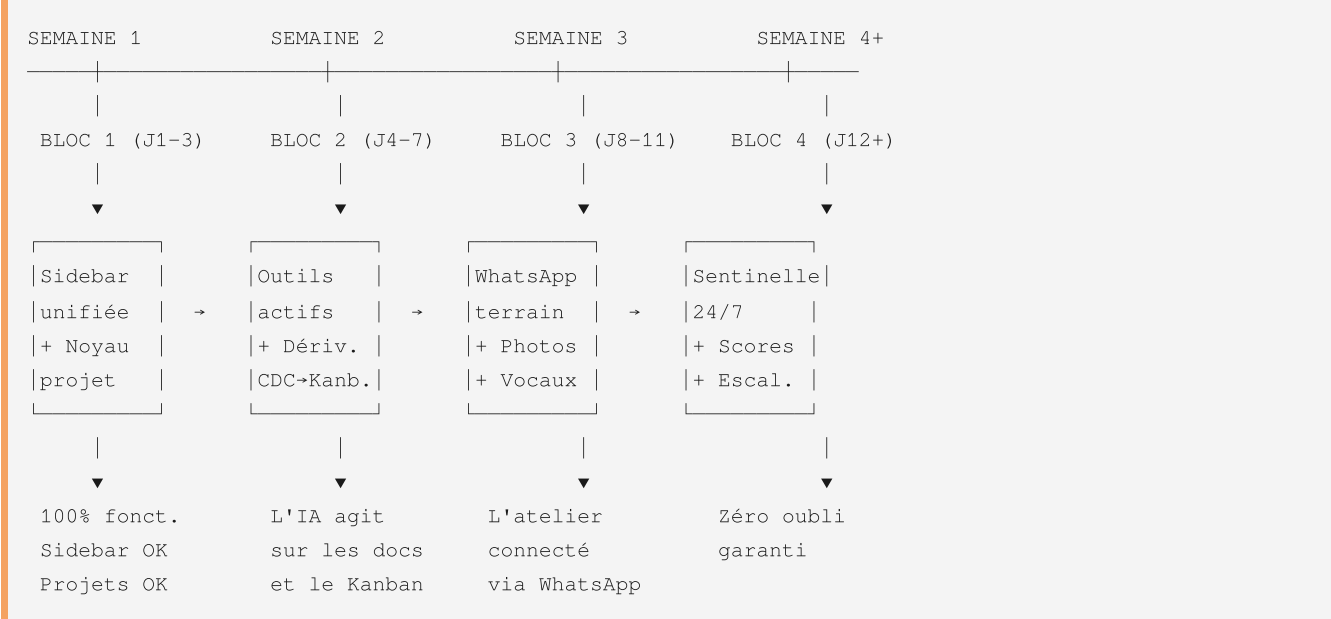

Bloc	Jours	Objectif	Livrable clé	Fonctionnel après ?
1	J1-3	Unifier sidebar + noyau projet	Sidebar route via API Hermes. Nouvelle page /projects/:id avec accordéons + Kanban	✔ OUI — sidebar 100% fonctionnelle, projets visibles
2	J4-7	Activer outils + dérivation	Skills Wari/Brico actifs. CDC→Kanban automatique. Checklists	✔ OUI — l'IA crée/modifie documents et tâches
3	J8-11	WhatsApp terrain	Communicant envoie/reçoit WhatsApp. Photos et vocaux → Supabase	✔ OUI — l'atelier est connecté
4	J12+	Surveillance autonome	Sentinelle scanne 24/7. Scores. Escalade automatique	✔ OUI — le système est autonome

12. Détail par bloc — Tâches, fichiers, validation

BLOC 1 — Unification Sidebar & Noyau Projet (Jours 1-3)

Objectif : La sidebar passe par l'API Hermes. La nouvelle page projet remplace l'ancienne.

Tâches Backend (Hermes)

#	Tâche	Détail
1.1	Créer les profils <code>hermes-wari</code> et <code>hermes-brico</code>	<code>hermes profile create</code> + copie des prompts depuis <code>agentConfigStore.ts</code>
1.2	Créer les skills de base	<code>product-search</code> , <code>document-create</code> , <code>manufacturing-rules</code>
1.3	Déployer le serveur API Hermes local	<code>server/hermes-api.ts</code> — Express sur port 11434
1.4	Coder le routeur de contexte	<code>hermesRouter.ts</code> + <code>pageContextDetector.ts</code>
1.5	Migrer les appels <code>sendChatRequest</code> → <code>hermesRouter.send</code>	Modifier <code>ChatContainer.tsx</code>

Tâches Frontend (AssoAI)

#	Tâche	Fichiers
1.6	Créer la migration SQL (tables <code>project_tasks</code> , <code>checklists</code> , <code>project_contacts</code>)	<code>supabase-migrations/003_project_management.sql</code>
1.7	Étendre <code>projects</code> (<code>status</code> , <code>phase</code> , <code>date_livraison</code> , <code>workflow_config</code>)	Migration SQL + <code>src/types/project.ts</code>
1.8	Créer les types TypeScript	<code>src/types/project-task.ts</code> , <code>src/types/checklist.ts</code>
1.9	Créer les hooks React Query	<code>src/hooks/useProjectTasks.ts</code> , <code>src/hooks/useChecklists.ts</code>
1.10	Nouvelle page <code>Projects.tsx</code> — liste en accordéon + recherche	<code>src/pages/Projects.tsx</code> (refonte)
1.11	Composant <code>ProjectAccordionCard</code>	<code>src/components/projects/ProjectAccordionCard.tsx</code>
1.12	Composant <code>ProjectSearchWidget</code> (recherche avec suggestions)	<code>src/components/projects/ProjectSearchWidget.tsx</code>
1.13	Composant <code>KanbanBoard</code> + <code>KanbanColumn</code> + <code>KanbanCard</code>	<code>src/components/projects/KanbanBoard.tsx</code>
1.14	Composant <code>ChecklistPanel</code> + <code>ChecklistSection</code>	<code>src/components/projects/ChecklistPanel.tsx</code>
1.15	Mise à jour <code>App.tsx</code> — routes	<code>App.tsx</code>

Fichiers supprimés (obsolètes)


```

X src/components/projects/ProjectDetails.tsx # Remplacé par Projects.tsx refondu
X src/components/projects/ProjectList.tsx # Fusionné dans Projects.tsx
X src/components/projects/ProjectCard.tsx # Remplacé par ProjectAccordionCard
X src/components/projects/ProjectModal.tsx # Remplacé par modal inline
X src/components/projects/AddToProjectModal.tsx # Plus nécessaire
X src/components/projects/SearchTemplatesModal.tsx # Remplacé par ProjectSearchWidget
X src/components/projects/ProjectWorkflow.tsx # Remplacé par KanbanBoard
X src/services/orchestrator.ts # Remplacé par hermesRouter
X src/services/dataInjector.ts # Remplacé par skills Hermes

```

Validation Bloc 1

- ✓ Sidebar ouverte sur /chat → Wari répond (via Hermes)
- ✓ Sidebar ouverte sur /products → Brico répond (via Hermes)
- ✓ Sidebar ouverte sur /projects/:id → PM répond (via Hermes)
- ✓ Page /projects : liste en accordéon avec recherche
- ✓ Page /projects/:id : onglets Documents, Kanban, Checklists, Chat
- ✓ Création projet : recherche facture existante OU nouvelle facture
- ✓ Kanban : création, édition, drag & drop entre colonnes
- ✓ Checklists : items cochables, barres de progression

BLOC 2 — Activation des Outils & Dérivation (Jours 4-7)

Objectif : Wari et Brico utilisent leurs vrais outils. Le flux CDC→Kanban est actif.

Tâches

#	Tâche	Détail
2.1	Activer les skills Wari	product-search, document-derivation, document-update, document-numbers
2.2	Activer les skills Brico	cdc-generate, material-calculator, cdc-parse, enseigne-dimensions
2.3	Créer le skill <code>cdc-parse</code>	Parse le JSON du CDC → extrait sections, matériaux, équipe
2.4	Créer le skill <code>kanban-manager</code>	CRUD <code>project_tasks</code> , création depuis CDC
2.5	Créer le skill <code>checklist-validator</code>	Validation auto, création depuis CDC
2.6	Implémenter le flux CDC→Kanban	Quand CDC créé → auto-parse → tâches + checklists
2.7	Activer la dérivation dans Wari	Facture→Commande avec <code>linked_facture_id</code> automatique
2.8	Créer le profil <code>hermes-pm</code>	+ skills : <code>project-orchestrator</code> , <code>kanban-manager</code> , <code>checklist-validator</code> , <code>project-reporting</code>
2.9	Intégrer le chat projet (session Hermes persistante)	<code>session_type = 'project'</code> dans messages
2.10	Page Configuration → Onglet Logs	Lecture des logs depuis Supabase <code>app_logs</code>

Validation Bloc 2

- ✓ Wari crée une facture → utilise les vrais prix du catalogue (skill product-search)
- ✓ Brico génère un CDC → les sections et matériaux sont extraits
- ✓ CDC créé → 8 tâches Kanban + 3 checklists auto-générées
- ✓ Dérivation facture→commande → linked_facture_id automatique
- ✓ Chat projet → PM répond avec le contexte du projet
- ✓ Page Configuration → Logs visibles et filtrables

BLOC 3 — Le Canal Terrain WhatsApp (Jours 8-11)

Objectif : L'équipe terrain reçoit et répond via WhatsApp. Photos et vocaux stockés.

Tâches

#	Tâche	Détail
3.1	Créer le profil hermes-communicant	+ skills : whatsapp-notifier, cron-reminders, message-router, escalation-manager
3.2	Configurer la gateway Hermes WhatsApp	hermes gateway setup → WhatsApp Business
3.3	Créer les templates WhatsApp	Rappel tâche, notification phase, question suivi, escalade
3.4	Activer message-router	Interpréter les réponses WhatsApp → MAJ Kanban/Supabase
3.5	Gérer les photos	Photo WhatsApp → required_image: true → Supabase Storage
3.6	Gérer les vocaux	Note vocale → transcription → commentaire Kanban
3.7	Programmer les crons	Vérification retards (4h), rapport quotidien (8h)
3.8	Activer l'escalade	Retard > 24h → rappel, > 48h → copie superviseur, > 72h → Admin

Validation Bloc 3

- ✓ Logisticien reçoit WhatsApp "Commander acrylique" → répond "Fait" → tâche cochée
- ✓ Technicien reçoit WhatsApp "Découpe panneaux" → envoie photo → attachée à la checklist
- ✓ 8h : Admin reçoit rapport quotidien WhatsApp
- ✓ Retard > 48h : Superviseur reçoit copie automatique
- ✓ Retard > 72h : Admin reçoit alerte critique

BLOC 4 — Surveillance Autonome (Jours 12+)

Objectif : La Sentinelle scanne 24/7. Scores, alertes, escalade automatique.

Tâches

#	Tâche	Détail
4.1	Créer le profil <code>hermes-sentinel</code>	+ skills : <code>project-watcher</code> , <code>anomaly-detector</code> , <code>health-scorer</code>
4.2	Déployer le cron horaire	<code>0 * * * *</code> → Sentinelle scanne tous les projets
4.3	Implémenter le Project Health Score	Formule : $25 \times (\text{docs}/3) + 25 \times (\text{tâches_ok}/\text{total}) + 25 \times (\% \text{checklists}) + 25 \times (1 - \text{blocage}/7)$
4.4	Détecter les patterns anormaux	Blocage prolongé, cascade de retards, incohérence documents
4.5	Activer l'escalade automatique	Score < 50 → Kanban Directeur, < 30 → WhatsApp Admin
4.6	Dashboard santé (optionnel)	Widget dans <code>/projects</code> montrant les scores

Validation Bloc 4

- ✓ Toutes les heures : Sentinelle scanne et calcule les scores
- ✓ Score < 50 : Alerte Kanban créée pour le Directeur
- ✓ Score < 30 : WhatsApp automatique à l'Admin
- ✓ Blocage > 7j : Escalade automatique
- ✓ Dashboard : scores visibles sur la liste des projets

13. Stratégie de transition — Ancien → Nouveau

13.1 Ce qui est supprimé (après Bloc 1)

Élément supprimé	Raison	Impact
<code>orchestrator.ts</code>	Remplacé par <code>hermesRouter.ts</code>	Aucun — le nouveau routeur fait mieux
<code>dataInjector.ts</code>	Remplacé par les skills Hermes	Aucun — les skills sont plus performants
<code>chatService.ts</code> (appel DeepSeek direct)	Remplacé par l'API Hermes	Aucun — Hermes gère l'appel
<code>agentConfigStore.ts</code> (injection <code>localStorage</code>)	Prompts migrés dans les profils Hermes	Les prompts sont migrés avant suppression
<code>tools.ts</code> (déjà inutilisé)	Déjà mort — suppression propre	Aucun
Anciens composants projet (7 fichiers)	Remplacés par la nouvelle interface	La nouvelle interface est plus riche

13.2 Ce qui est préservé

Élément préservé	Pourquoi
SlidingChatPanel.tsx	UI inchangée
MessageInput.tsx (sélecteur Wari/Brico)	Conservé visuellement, logique adaptée
ChatMessage.tsx, QuoteMessage.tsx	Affichage des messages inchangé
TemplateQuoteCard.tsx	Affichage des documents cités inchangé
TemplateRenderer.tsx, tous les templates	Rendu des documents inchangé
ProductSuggestions.tsx	Sélection produit dans les formulaires inchangée
database.ts (saveMessage, repairIsLatest)	Logique de persistance préservée
Tous les types (template-data.ts, etc.)	Structures de données inchangées
Page /agent-config → devenue page Configuration	Évolution, pas suppression

13.3 Ordre de migration — Zéro interruption

1. Créer les nouveaux fichiers (hermesRouter, pageContextDetector, etc.)
2. Créer les profils Hermes (wari, brico, pm) AVEC les prompts migrés
3. Déployer le serveur API Hermes local
4. Modifier ChatContainer.handleSendMessage → hermesRouter.send
5. TESTER : la sidebar fonctionne toujours
6. Déployer les nouvelles tables Supabase
7. Déployer la nouvelle page /projects
8. SUPPRIMER les fichiers obsolètes
9. Commiter, builder, déployer

→ L'utilisateur ne voit aucune interruption.

→ La sidebar fonctionne à l'étape 5 (avant même le nouveau projet).

→ Les anciens projets sont toujours visibles (les données sont dans Supabase).

14. Récapitulatif des livrables

Base de données

Type	Nombre	Détail
Nouvelles tables	3	project_tasks, checklists, project_contacts
Tables modifiées	2	projects (+5 colonnes), messages (+2 colonnes)
Migration SQL	1	supabase-migrations/003_project_management.sql

Code Frontend (AssoAI)

Type	Nombre	Détail
Nouveaux fichiers	18	hermesRouter.ts, pageContextDetector.ts, serveur API, types (2), hooks (3), composants projet (9), Kanban (3)
Fichiers modifiés	6	ChatContainer.tsx, Projects.tsx, App.tsx, TopBar.tsx, agent-config.tsx → Configuration, types/project.ts
Fichiers supprimés	10	orchestrator.ts, dataInjector.ts, 7 composants projet obsolètes, tools.ts

Profils & Skills Hermes

Type	Nombre	Détail
Profils Hermes	5	hermes-wari, hermes-brico, hermes-pm, hermes-communicant, hermes-sentinelle
Skills	21	6 (Wari) + 5 (Brico) + 5 (PM) + 4 (Communicant) + 3 (Sentinelle) = 23 (dont 2 partagés)
Serveur API	1	server/hermes-api.ts (Express, port 11434)
Cron jobs	4	Scan horaire, rapport 8h, vérification retards 4h, escalade silence 24h

Arborescence finale

```

/workspace/chat-flow-templates-main/
├─ src/
│   ├─ services/
│   │   ├─ hermesRouter.ts          ← NOUVEAU (remplace orchestrator.ts)
│   │   ├─ pageContextDetector.ts   ← NOUVEAU
│   │   ├─ chatService.ts           ← MODIFIÉ (appelle Hermes, pas DeepSeek direct)
│   │   ├─ database.ts              ← PRÉSERVÉ
│   │   └─ ...
│   ├─ components/
│   │   ├─ chat/
│   │   │   ├─ ChatContainer.tsx     ← MODIFIÉ (handleSendMessage)
│   │   │   ├─ MessageInput.tsx     ← PRÉSERVÉ (UI) + adapté (logique)
│   │   │   └─ SlidingChatPanel.tsx ← PRÉSERVÉ
│   │   │   └─ ...
│   │   └─ projects/
│   │       ├─ ProjectAccordionCard.tsx ← NOUVEAU
│   │       ├─ ProjectSearchWidget.tsx ← NOUVEAU
│   │       ├─ KanbanBoard.tsx        ← NOUVEAU
│   │       ├─ KanbanColumn.tsx      ← NOUVEAU
│   │       ├─ KanbanCard.tsx        ← NOUVEAU
│   │       ├─ ChecklistPanel.tsx     ← NOUVEAU
│   │       ├─ ChecklistSection.tsx   ← NOUVEAU
│   │       ├─ ProjectChat.tsx       ← NOUVEAU
│   │       └─ ProjectProgress.tsx    ← NOUVEAU
│   ├─ pages/
│   │   ├─ Projects.tsx              ← REFONTE COMPLÈTE
│   │   ├─ AgentConfig.tsx          ← ÉVOLUTION → Configuration (3 onglets)
│   │   └─ ...
│   ├─ types/
│   │   ├─ project-task.ts          ← NOUVEAU
│   │   ├─ checklist.ts             ← NOUVEAU
│   │   └─ project.ts               ← MODIFIÉ (+status, +phase, etc.)
│   └─ hooks/
│       ├─ useProjectTasks.ts        ← NOUVEAU
│       ├─ useChecklists.ts          ← NOUVEAU
│       └─ useProjects.ts            ← MODIFIÉ
├─ server/
│   └─ hermes-api.ts                ← NOUVEAU (serveur Express)
└─ supabase-migrations/
    └─ 003_project_management.sql    ← NOUVEAU

~/.hermes/profiles/
├─ hermes-wari/                    ← NOUVEAU (prompt Wari migré)
├─ hermes-brico/                   ← NOUVEAU (prompt Brico migré)
├─ hermes-pm/                      ← NOUVEAU
├─ hermes-communicant/             ← NOUVEAU
└─ hermes-sentinelle/              ← NOUVEAU

~/.hermes/skills/
├─ product-search/                 ← NOUVEAU (Wari + Brico)
├─ document-create/                ← NOUVEAU (Wari)
├─ document-derivation/            ← NOUVEAU (Wari)
├─ document-update/                ← NOUVEAU (Wari)
├─ document-numbers/              ← NOUVEAU (Wari)
├─ client-suggestions/             ← NOUVEAU (Wari)
└─ manufacturing-rules/            ← NOUVEAU (Brico)

```

```
|─ cdc-generate/          ✦ NOUVEAU (Brico)
|─ cdc-parse/            ✦ NOUVEAU (Brico)
|─ material-calculator/ ✦ NOUVEAU (Brico)
|─ enseigne-dimensions/ ✦ NOUVEAU (Brico)
|─ project-orchestrator/ ✦ NOUVEAU (PM)
|─ kanban-manager/       ✦ NOUVEAU (PM)
|─ checklist-validator/  ✦ NOUVEAU (PM)
|─ project-reporting/    ✦ NOUVEAU (PM)
|─ team-coordinator/     ✦ NOUVEAU (PM)
|─ whatsapp-notifier/    ✦ NOUVEAU (Communicant)
|─ cron-reminders/       ✦ NOUVEAU (Communicant)
|─ message-router/       ✦ NOUVEAU (Communicant)
|─ escalation-manager/   ✦ NOUVEAU (Communicant)
|─ project-watcher/      ✦ NOUVEAU (Sentinelle)
|─ anomaly-detector/     ✦ NOUVEAU (Sentinelle)
|─ health-scorer/        ✦ NOUVEAU (Sentinelle)
```

Temps estimé : 12-15 jours (4 blocs)

Prochaine action immédiate

Démarrage Bloc 1 — Jour 1 : 1. Créer les profils `hermes-wari` et `hermes-brico` avec les prompts migrés 2. Déployer les tables Supabase (migration SQL) 3. Créer les types TypeScript 4. Coder `hermesRouter.ts` + `pageContextDetector.ts` 5. Modifier `ChatContainer.handleSendMessage`

→ La sidebar reste 100% fonctionnelle, mais son moteur est modernisé.
